# NEPTUN MÄTFORMULÄR

Ordernummer:

Datum:

Kundnamn:

**VIKTIGT!**
Alla mått som anges i formuläret ska vara exakt uppmätta och anges i millimeter.
Felaktigt angivna mått kan göra att överdraget inte passar eller inte går att installera enligt anvisningarna.
Folkpool ansvarar inte för merkostnader vid felaktigt ifyllda uppgifter.
För att säkerställa så lamellerna löper fritt längs poolen tillverkas dom med undermått , poolen bredd minus ca 30mm.

Beställningen avser:

Typ av pool:

Vattennivå: ◯ Hög vattennivå ◉ Normal vattennivå

Balk täcklock

Konsol med hjul för balk lamellöverdrag Neptun (Ingår ej)

◯ Ja ◉ Nej

Om man önskar extra stadigt lock över drivenheten till Neptun används dessa konsoler(3847236 )
Rekommenderas 1st konsoler per anläggning upp till 8m bredd.

Separat jordning: för rör Ø 50 mm: Ja ◉ Nej ◯

Lameller: PVC Lamell Lamell färg:

Låsanordning: Pushlock Färg:

Styrning: Wi-Key

Beslag: Hängmonterat

Ytbeläggning: Liner

Bräddavlopp: ◯ Kortsida ◉ Långsida

Måste ha exakt mått på bräddavloppets placering.

Bräddavlopp position: ◉ Jäms med väggen
◯ Utstickande mm

Diagonalmått:
Diagonal AC = mm
Diagonal BD = mm

OBS!! Diagonalern får maximalt avvika +/- 20mm från nedan angiven mått.

Säkerhetsvägg: ◉ Ja ◯ Nej

Färg:

Poolprofil: Plan botten

Dimensioner: B = avstånd kortsidevägg till säkerhetsvägg, pool längdmått:

A: mm
B: mm
C: mm

| |
|---|
| < 6m = 550mm |
| 6-7m = 580mm |
| 7-8m = 600mm |
| 8-9m = 630mm |
| 9-10m = 650mm |
| 10-11m = 670mm |
| 11-12m = 690mm |

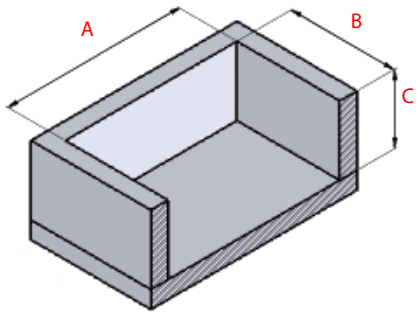


Observera!

-Stativet till upprullningen är alltid placerad på sida A/B

Breddmått:

-Lamellerna tillverkas ca 30mm smalare än poolens minsta breddmått.

-Tänk på att väggmattan/cellplasten bygger ca 10mm vilket gör poolen smalare än mått angivet i produktbenämningen.

POOLMÅTT

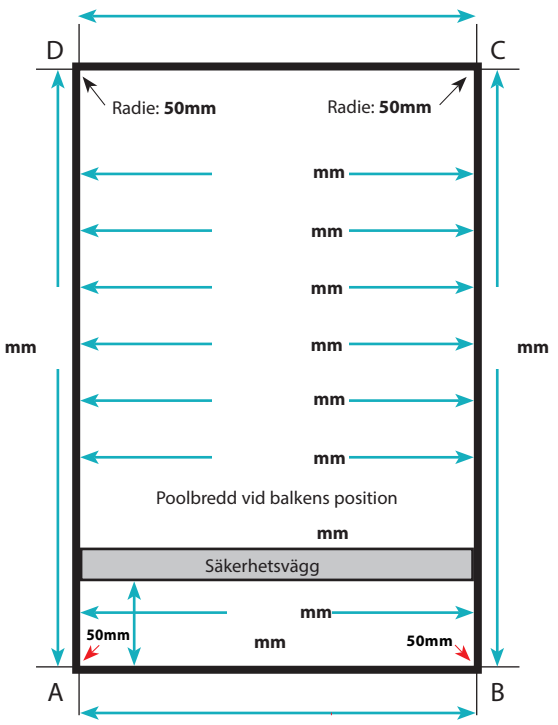





*Detta mått måste vara samma som breddmått ovankant

Folkpool AB
Ullängsvägen 1
153 30 Järna
info@folkpool.se

13/02/2023
